


月間工程表		工事名称 (仮称) まちづくり支援拠点施設整備業務		建築主 福山市長 枝広直幹		工 期		大和・あい・瀬戸・中電工・小品 (仮称)まちづくり支援拠点施設整備共同企業体																										
		工事場所 福山市草戸町五丁目地内		延床面積 3,903.08㎡ (カーポート等含む)		準備工着手 令和7年1月14日		大和建设株式会社																										
		工事概要 地上2階建(1階:鉄筋コンクリート造、2階:木造、鉄筋コンクリート造)		竣 工 令和8年3月31日		現場代理人 山下 晃司 印																												
No.	月	2025年3月実施											4月 2025年3・4月計画 ※赤は休日 青は生コン工場休日																					
	日	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		
1	仮設工事						親墨出し I工区					25t ラフター		墨出し II工区			25t ラフター								25t ラフター									
2	杭・地業工事						杭打機解体																											
3	土工事																																	
4	鉄筋工事																																	
5	型枠工事																																	
6																																		
7																																		
8	電気設備工事																																	
9	給排水衛生設備工事																																	
10	空調設備工事																																	
	備 考																																	
	安全目標	車両接触災害防止 : 掘削した法肩の地盤状態の確認をし、必要に応じて転落防止の表示や昇降設備を設置する。																																

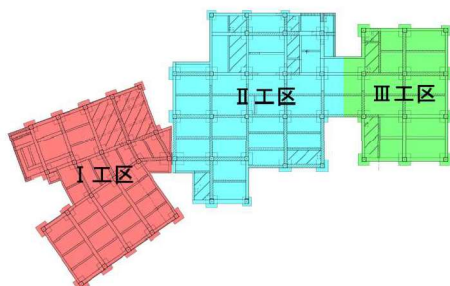

3/28現在 工事進捗率  
 予定工程 7%  
 実施工程 5%

春分の日  
 生コン工場休み

第3回定期会議

第4回定期会議  
 生コン工場休み
