月間工程表

工事名称	(仮称) まちづくり支援拠点施設整備業務	建築主	福山市長　枝広直幹	工期	大和・あい・瀬戸・中電工・小畠 (仮称)まちづくり支援拠点施設整備共同企業体
工事場所	福山市草戸町五丁目地内	延床面積	3,903.08㎡ (ｶｰﾎﾟｰﾄ等含む)	準備工着手 令和7年1月14日	大和建設株式会社
工事概要	地上2階建(1階:鉄筋コンクリート造、2階:木造、鉄筋コンクリート造)			竣工 令和8年3月31日	現場代理人　山下　晃司　印

2025年3月実施　　2025年3月計画　※赤は休日　青は生コン工場休日

No.	月	日	曜日
		1	土
		2	日
		3	月
		4	火
		5	水
		6	木
		7	金
		8	土
		9	日
		10	月
		11	火
		12	水
		13	木
		14	金
		15	土
		16	日
		17	月
		18	火
		19	水
		20	木
		21	金
		22	土
		23	日
		24	月
		25	火
		26	水
		27	木
		28	金
		29	土
		30	日
		31	月

No.	工種	内容
1	仮設工事	墨出し Ⅰ工区 / 墨出し Ⅱ工区 / 25t ﾗﾌﾀｰ / 重機搬入 / Ⅰ工区　山留工事 (鋼矢板) シートパイル
2	杭・地業工事	B棟 (21本) / 随時検査 13：30～ / 杭打機解体 / Smart-MAGNUM工法(標準型) / 地中障害あり / A棟 (35本) 2～3本/日 / 50/56本完了 / 夜間搬出 21：00～ / Ⅰ工区 杭頭補強筋　杭10箇所/日
3	土工事	杭残土搬出 ～松浦組～ / 重機搬入 / 掘削 / Ⅰ工区 砕石・捨てｺﾝ / Ⅱ工区 掘削・砕石・捨てｺﾝ / 簡易土留め / Ⅲ工区
4	鉄筋工事	加工場 材料搬入予定 / 加工場 材料搬入 / 基礎鉄筋加工 / 材料搬入
5	型枠工事	小墨 墨出し
6		
7		
8	電気設備工事	書類作成・準備工 / Ⅰ工区ｽﾘｰﾌﾞ墨出し
9	給排水衛生設備工事	書類作成・準備工 / Ⅰ工区ｽﾘｰﾌﾞ墨出し
10	空調設備工事	書類作成・準備工 / Ⅰ工区ｽﾘｰﾌﾞ墨出し

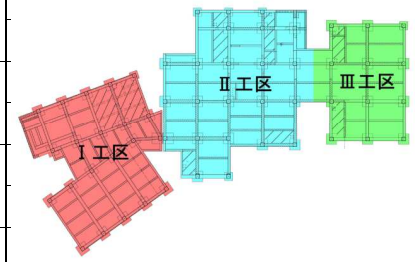

備考	
8日	生コン工場休み
10日～14日	随時検査
14日	第2回定例会議
20日	春分の日
22日	生コン工場休み
28日	第3回定例会議

安全目標	
車両接触災害防止	：掘削した法肩の地盤状態の確認をし、必要に応じて転落防止の表示や昇降設備を設置する。
