月間工程表

工事名称	(仮称) まちづくり支援拠点施設整備業務	建築主	福山市長　枝広直幹	工期	大和・あい・瀬戸・中電工・小畠 (仮称)まちづくり支援拠点施設整備共同企業体
工事場所	福山市草戸町五丁目地内	延床面積	3,903.08㎡ (ｶｰﾎﾟｰﾄ等含む)	準備工着手　令和7年1月14日	大和建設株式会社
工事概要	地上２階建(１階:鉄筋コンクリート造、２階:木造、鉄筋コンクリート造)			竣工　令和8年3月31日	現場代理人　山下　晃司　印

※赤は休日　青は生コン工場休日

No.	月	2025年4月実施												2025年4・5月計画																	
	日	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	5/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	木
1	揚重設備			25ｔﾗﾌﾀｰ							25ｔﾗﾌﾀｰ														25ｔﾗﾌﾀｰ					25ｔﾗﾌﾀｰ		
	墨出し																										Ⅰ工区		墨出し			
2	Ⅰ工区		型枠返し・ｶﾀﾒ				相番		型枠解体（側板）		搬出							埋戻し	採石敷							シートﾊﾟｲﾙ矢板	撤去		断熱材敷		土間配筋	
3		ﾋﾟｯﾄCON打設 左官押え					Ⅰ工区基礎CON 435m3					Ⅰ工区通路足場 解体														ｷｬｽﾎﾟﾙ 地耐力試験						
4	Ⅱ工区	SG溶接接手	Ⅱ工区基礎配筋		営繕課配筋検査		ﾌｶｼ筋・壁差筋		随時検査　13：30～	基礎建込			返し・ｶﾀﾒ						相番						型枠解体（側板）		搬出			埋戻し		
5					Ⅱ工区 基礎通路足場							ﾋﾟｯﾄCON打設 左官押え							Ⅱ工区基礎 CON314m3		G・W　休暇							Ⅱ工区 通路足場解体				
6	Ⅲ工区	Ⅲ工区杭頭補強筋			キソエース						Ⅲ工区基礎配筋				営繕課配筋検査																	
											SG溶接接手			ﾊｶﾏ・ｶﾀﾒ	壁・ﾌｶｼ差筋			Ⅲ工区基礎 型枠建込							返しｶﾀﾒ					相番	養生	
7													Ⅲ工区 基礎通路足場												ﾋﾟｯﾄCON打設 左官押え					Ⅲ工区 CON264m³		
8	電気設備工事	Ⅲ工区墨出			Ⅱ工区スリーブ施工		Ⅰ工区相番						Ⅲ工区スリーブ施工						相番 Ⅱ工区	Ⅰ工区埋設					配管		Ⅰ工区外周埋設 配管				Ⅱ工区 埋設配管	
		書類・施工図作成・準備工																														
9	給排水衛生設備工事						Ⅰ工区 CON合番												Ⅱ工区 相番													
		Ⅲ工区墨出			Ⅱ工区 スリーブ入れ							Ⅰ工区フカシスリーブ入れ	Ⅲ工区スリーブ施工							Ⅰ工区埋設					配管		Ⅰ工区外周埋設 配管				Ⅱ工区 埋設配管	
10	空調設備工事	書類・施工図作成・準備工																														
	備考	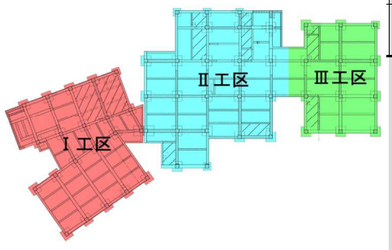							13：30～ 随時検査				第5回定例会議	生コン工場休み			昭和の日				憲法記念日	みどりの日	こどもの日	振替休日				第6回定例会議	生コン工場休み			

	安全目標	環境安全と汚染予防　：埋戻し及び地盤改良時には、重機作業半径内（関係者以外）立入禁止措置をするとともに、重機足元が不安定にならないよう操作をさせる。

4/25現在　工事進捗率

予定工程	12%
実施工程	7%
